



INQUADRAMENTO - SCALA 1:20

## STATO DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di nuove strutture cimiteriali e la sistemazione complessiva delle aree esterne, con l'obiettivo di ampliare la disponibilità di sepolture e migliorare l'accessibilità e il decoro del complesso.

Nell'**Area 01** è previsto l'inserimento di due nuove gallerie di loculi prefabbricati in cemento armato, disposte in continuità con quelle già esistenti. Ogni galleria avrà 3 livelli per un totale di 51 loculi, pari a 102 complessivi, dimensionati per ospitare anche feretri fuori standard. Le gallerie saranno impostate a gradoni per assecondare il dislivello naturale del terreno e dotate di muri terminali e pensiline prefabbricate di copertura. La struttura sarà completata con impermeabilizzazione del lastrico solare, smaltimento delle acque meteoriche mediante pluviali in PVC, lastre epigrafiche in marmo di Orosei con fissaggi in ottone e tinteggiatura finale delle parti a vista.

Nell'**Area 02**, lungo la nuova rampa di collegamento con il cimitero storico, si prevede la posa di 24 tombe familiari prefabbricate doppie sovrapposte, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza e interrate per metà, con altezza fuori terra pari a 80 cm. Gli spazi di separazione tra i manufatti (minimo 1,20 m) consentiranno un agevole passaggio dei visitatori. Le aree di transito saranno pavimentate in calcestruzzo architettonico e, nella parte finale, in autobloccanti di cemento in calcestruzzo.

Si prevede inoltre la posa di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche collegata a quella esistente, con adeguamento e messa in quota di caditoie e chiusini, e la realizzazione di aree a verde con aiuole irrigate, prato fiorito e piantumazione di 5 nuove alberature, così da integrare i nuovi interventi con l'ambiente circostante e conferire al complesso un aspetto ordinato, decoroso e funzionale.




## COMUNE DI OSSI

## Provincia di Sassa

PROGETTO ESECUTI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI OSSI  
CUP B49D25000420002 - CIG B81B95FF12

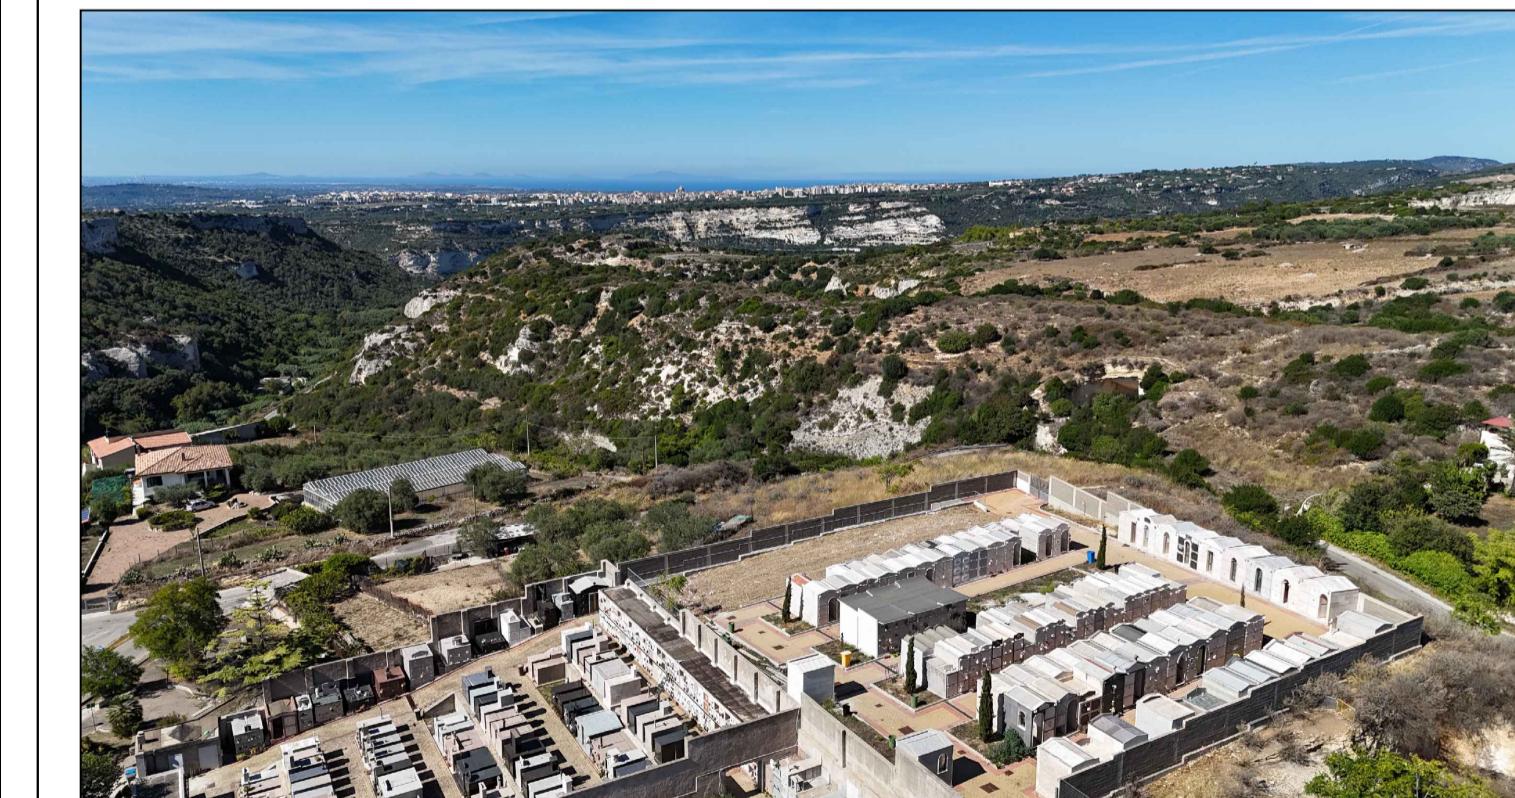

## Tecnici incaricati

## Tecnici incaricati

### **Responsabile Unico del Procedimento:**

### Responsabile Unico del Procedimento

## Collaboratori

## Il Sindaco

## TAV.03 STATO DI PROGETTO

REV. 00 09.2025

